




**Projekttitlel:** Wiederherstellung Erlenbächli

Gewässer	
Gemeinde	Splügen
Einzugsgebiet	Hinterrhein
Gewässer	Erlenbächli
Gewässernummer	2.7.1
Gewässertyp	Wiesenbach
Fischarten	Bachforellen
Besonderheiten	Aufzuchtgewässer

Trägerschaft / Kosten	
Bauherrschaft	Gemeinde Splügen
Ausführung	Gemeinde Splügen, JFA M. Eichhoff, Fischereiverein Rheinwald
Baubegleitung	HFA H. Wolf
Kosten	1243.--
Finanzierung	Amt für Jagd- und Fischerei, Chur
Bauzeit	2003

Projektperimeter			
Blatt LK 25:0000	1255 Splügenpass	Koordinaten	744.160 / 156.900
Länge	ca. 200 m	Breite	ca. 1.50 m

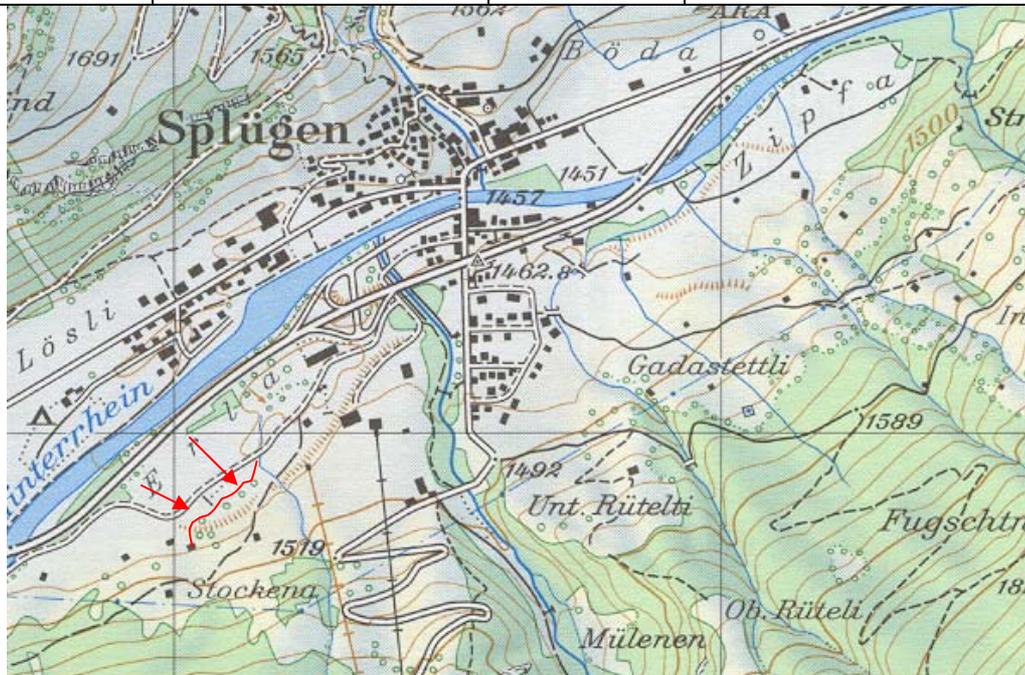



### Ausgangszustand

Heftige Niederschläge im November 2002 verursachten massive Hangrutschungen mit Schutt und Geröll. Der Erlenbach wurde zugedeckt und seitlich abgedrängt.

### Projektziele

Abgelagertes Geröll und Schutt teilweise umlagern und abtransportieren. Alter Bachlauf wiederherstellen.

### Maßnahmen

- Material teilweise abtransportiert
- Material umgelagert
- Ursprüngliches Bachbett wieder hergestellt
- Sohle Bachdurchlass fischgerecht gestaltet

### Bewertung der Maßnahmen

Hochwasserschutz	Gewährleistet
Ökologische Funktionsfähigkeit	verbessert
Systemrelevanz	bedeutend
Leitarten	Bachforellen
Lebensräume	Verbessert
Landschaftsbild	Klare Aufwertung
Freizeitwert	Erhöht, da System wieder naturnah
Kosten-Nutzenverhältnis	Optimal, da größtenteils Eigenleistung

### Erfolgskontrollen

Ausgeführt, Ergebnis gut



**Bilddokumentation**

Vorher



Durch Rufe zugeschüttet

Nachher

